



## Thomas Kalman

Tel.: 02051 / 310752

E-Mail: [kalman@architekt-krieger.de](mailto:kalman@architekt-krieger.de)

KRIEGER Architekten | Ingenieure GmbH

Blumenstraße 2  
42551 Velbert  
Tel.: 02051 3107-0  
Fax : 02051 3107-90

[info@architekt-krieger.de](mailto:info@architekt-krieger.de)  
[www.architekt-krieger.de](http://www.architekt-krieger.de)

## Andreas Grube

Tel.: 05241 / 70822-80

E-Mail: [a.grube@gjl.de](mailto:a.grube@gjl.de)

G J L+ Freie Architekten  
Grube Jakel Löffler Frenz Graf  
PartGmbB

Isselhorster Straße 212  
33335 Gütersloh  
Tel.: 05241 70822-70  
Fax : 05241 70822-99

[info@gjl.de](mailto:info@gjl.de)  
[www.gjl.de](http://www.gjl.de)

## Jannik Sträter

Tel.: 05241 / 70822-73

E-Mail: [j.straeter@gjl.de](mailto:j.straeter@gjl.de)

G J L+ Freie Architekten  
Grube Jakel Löffler Frenz Graf  
PartGmbB

Isselhorster Straße 212  
33335 Gütersloh  
Tel.: 05241 70822-95  
Fax : 05241 70822-99

[info@gjl.de](mailto:info@gjl.de)  
[www.gjl.de](http://www.gjl.de)

## Anna Förster

Tel.: 05241 / 70822-87

E-Mail: [a.foerster@gjl.de](mailto:a.foerster@gjl.de)

G J L+ Freie Architekten  
Grube Jakel Löffler Frenz Graf  
PartGmbB

Isselhorster Straße 212  
33335 Gütersloh  
Tel.: 05241 70822-87  
Fax : 05241 70822-99


[info@gjl.de](mailto:info@gjl.de)  
[www.gjl.de](http://www.gjl.de)

# Kostengegenüberstellung






## Kostenübersicht Gesamtschule inkl. Veranstaltungsräumlichkeiten und Gestaltung der Freianlagen

<b>Kostengruppe/ Bezeichnung</b>	<b>Kostenberechnung Preisstand 2. Q 2022</b> incl. NTW	<b>Kostenübersicht Stand 28.06.2024</b> incl. NTW	<b>Kostenübersicht Stand 29.08.2024</b> incl. NTW
KG 200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €
KG 300 Bauwerk- Baukonstruktion	18.372.422 €	18.836.745 €	21.639.086 €
KG 400 Bauwerk -Technische Anlagen	6.682.572 €	6.958.478 €	6.800.844 €
KG 700 Baunebenkosten	7.140.595 €	8.928.013 €	9.187.364 €
Summe Erweiterung und Sanierung Gesamtschule (ohne KG 600)	32.195.589 €	34.723.236 €	37.627.294 €
vorbereitende Maßnahmen	1.176.000 €	1.532.989 €	1.561.251 €
Containeranlage Schule	1.850.000 €	1.236.177 €	1.236.177 €
Außenanlagen	3.486.879 €	3.442.366 €	3.393.917 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.708.468 €</b>	<b>40.934.768 €</b>	<b>43.818.638 €</b>

# Termine

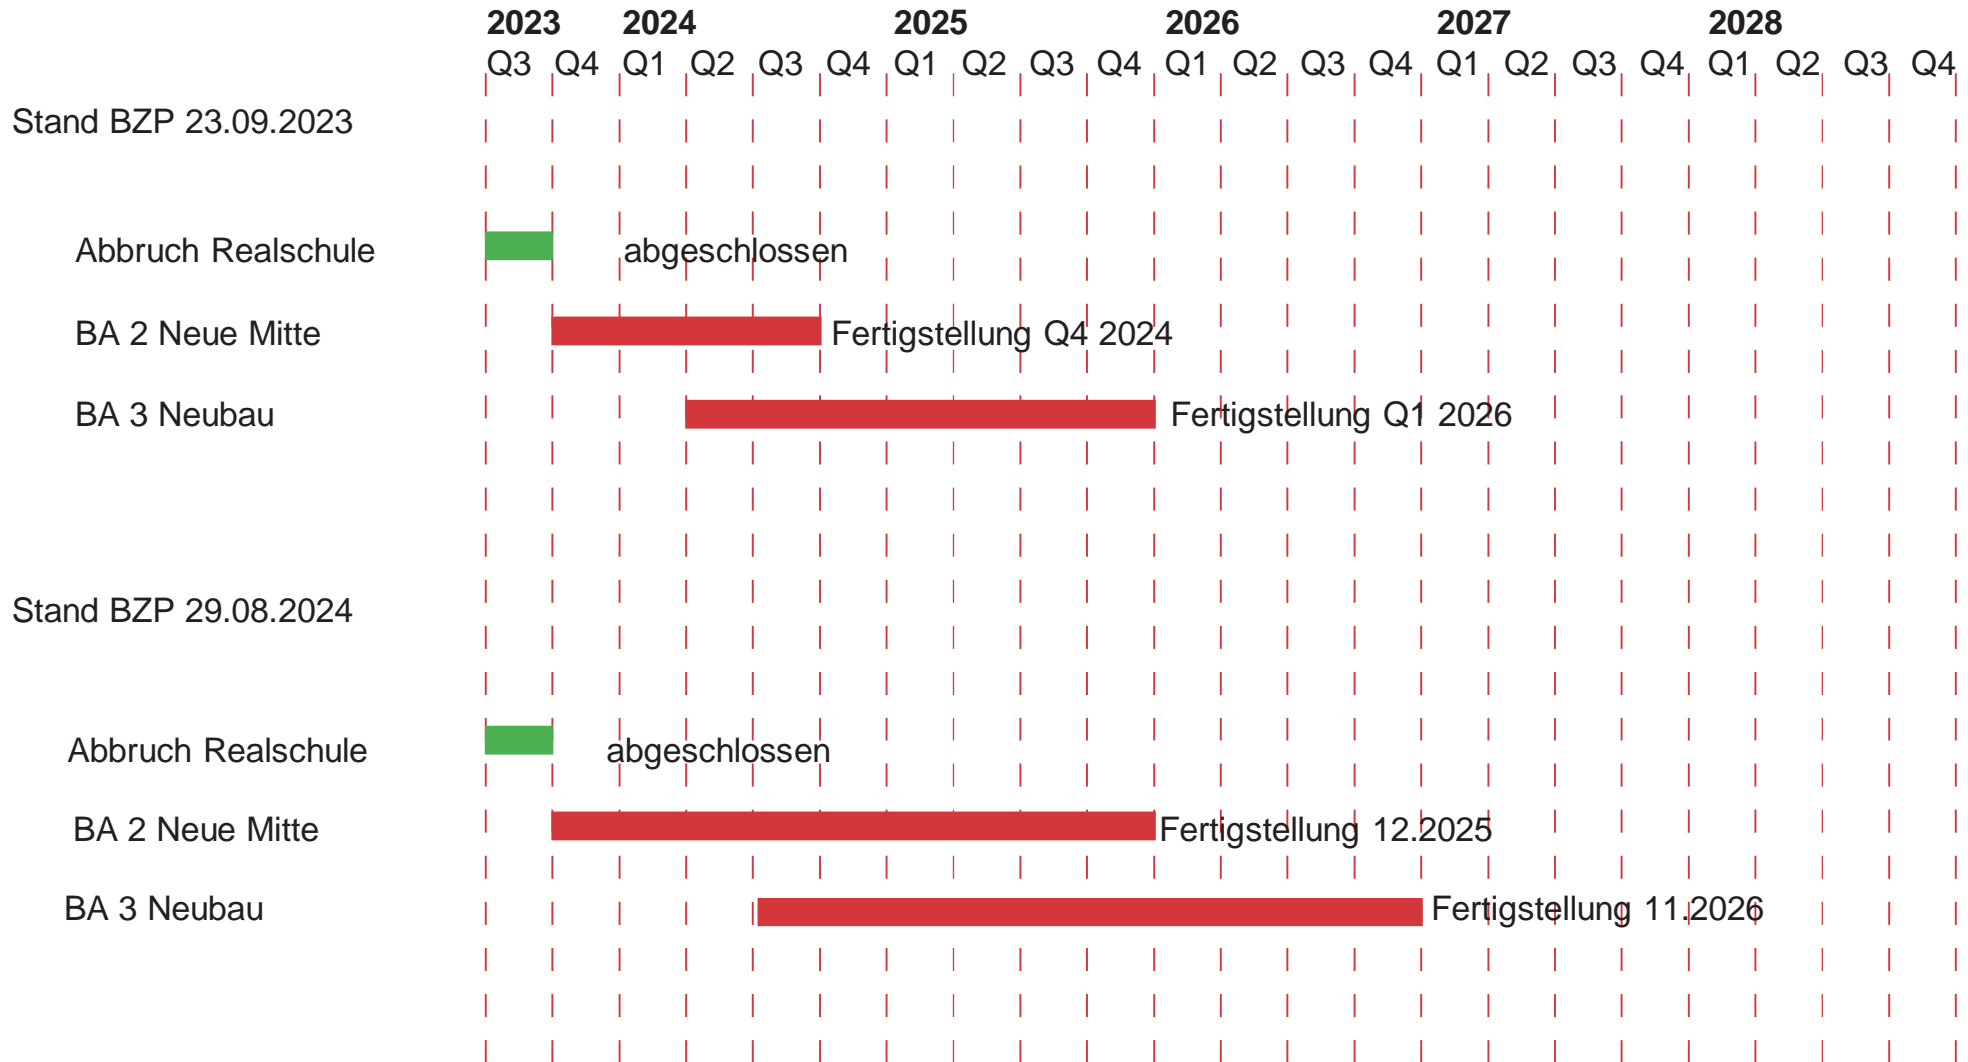

# Kostenentwicklung am Beispiel

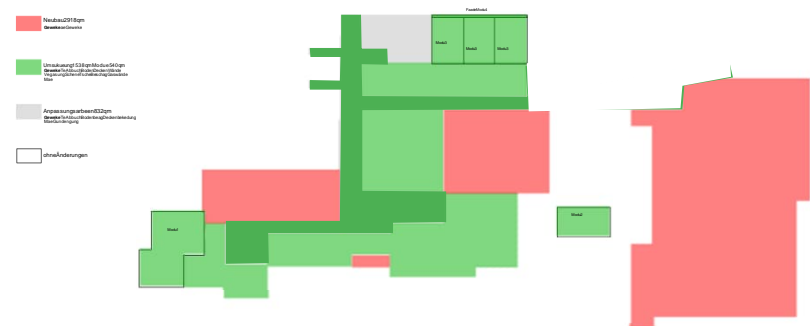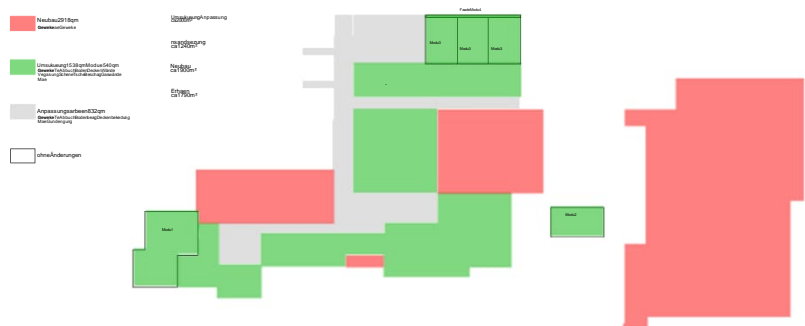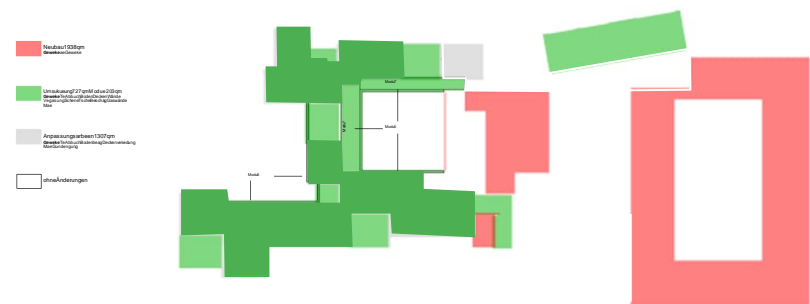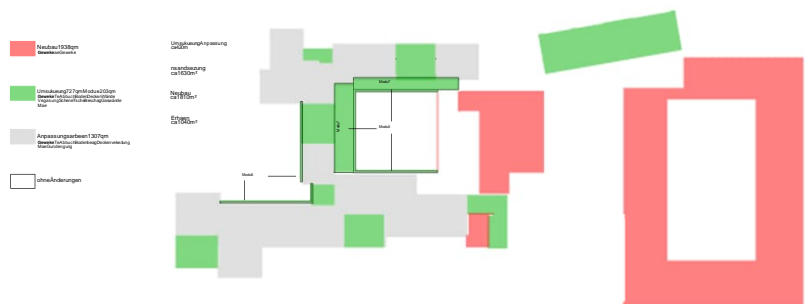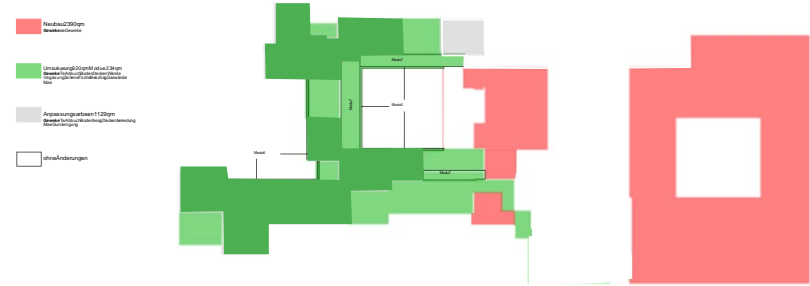

# Termine

